


ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

สนน.๐๒ รายงานผลแผนงานการระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหลและการขุดลอก-คูคลอง

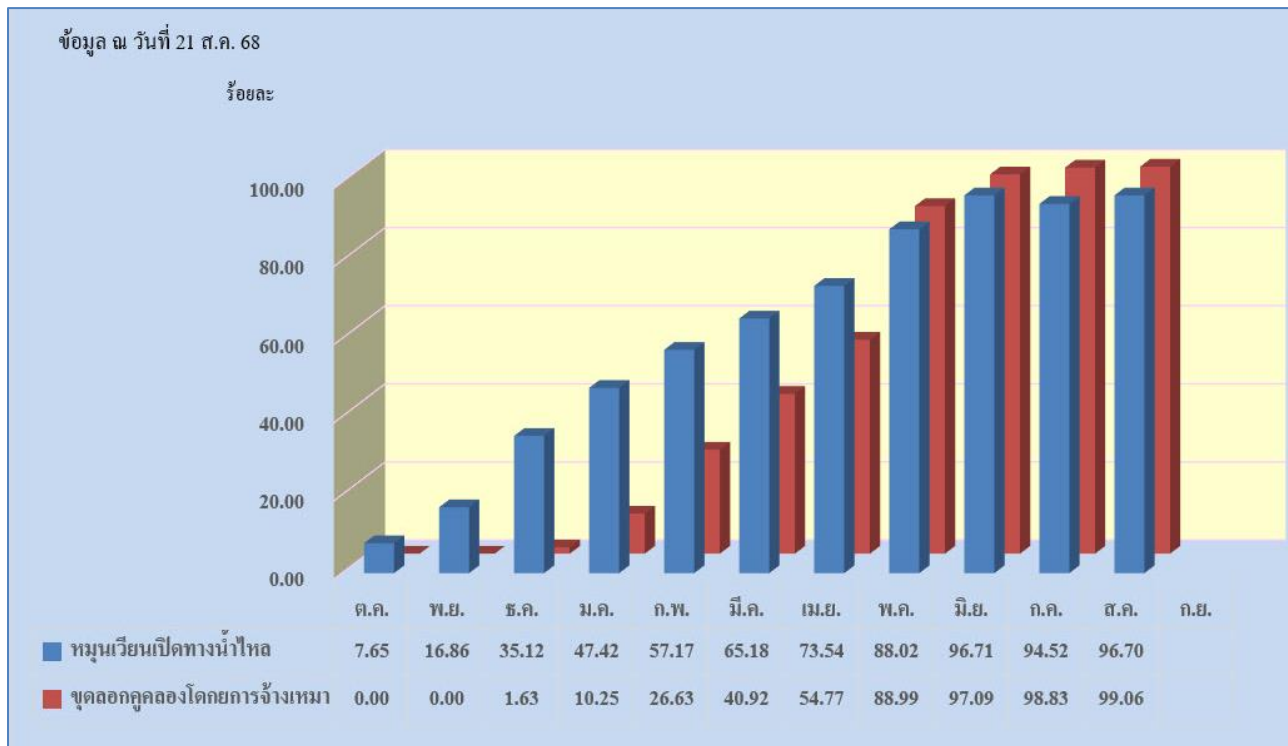

ประจำเดือน สิงหาคม (งวดวันที่ 16-31 สิงหาคม 2568)

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 21 สิงหาคม 2568

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนคู-คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คู-คลองที่ดูแลเปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						คู-คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา														หมายเหตุ		
				ดูแลประจำ		หมุนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		แผนงานปีนี้		ได้รับงบประจำปี				ผลงานงบประจำปี		ได้รับงบเพิ่มเติม				ผลงานงบเพิ่มเติม			ผลงานรวม	
		คู-คลอง	เมตร	คู-คลอง	เมตร	คู-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	คู-คลอง	เมตร	คู-คลอง	เมตร	งบประมาณ	วงเงินก้อนนี้	เมตร	ร้อยละ	คู-คลอง	เมตร	งบประมาณ	วงเงินก้อนนี้	เมตร	ร้อยละ		เมตร	ร้อยละ
1	คลองเตย	9	5,178	0	0	9	5,178	5,178	100.00	0	0	0	0			-	0.00	0	0			-	0.00	0	0.00	-
2	คลองสาน	32	13,155	0	0	32	13,155	13,155	100.00	8	2,235	8	2,235	1,828,000	-	2,235	100.00	0	0			0	0.00	2,235	100.00	-
3	คลองสามวา	72	144,921	6	16,200	8	35,860	35,860	100.00	9	15,775	9	15,775	21,206,000	-	15,775	100.00	0	0			0	0.00	15,775	100.00	-
4	คันนายาว	29	31,217	14	6,894	10	15,351	15,351	100.00	8	7,134	8	7,134	-	-	7,134	100.00	-	-	-	-	0	0.00	7,134	100.00	-
5	จตุจักร	11	7,459	6	2,926	5	4,533	4,533	100.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0	0.00	-
6	จอมทอง	108	65,428	0	0	96	59,426	59,426	100.00	12	6,002	12	6,002	7,092,000	3,933,674	6,002	100.00	0	0			-	0.00	6,002	100.00	เปิดทาง น้ำไหล ซ้ำ ความ ยาวรวม 18698 เมตร (เปิดทาง น้ำไหล ลำ กระโคง ที่ไม่อยู่ ในบัญชี 4 แห่ง)
7	ดอนเมือง	14	20,063	0	0	14	20,063	20,063	100.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0	0.00	-
8	ดินแดง	21	4,832	0	0	5	774	774	100.00	0	0	0	0			0	0.00	0	0			0	0.00	0	0.00	-
9	ดุสิต	18	11,056	0	0	16	10,433	10,433	100.00	2	620	2	620	1,329,000		620	100.00	0	0			0	0.00	620	100.00	-
10	ตลิ่งชัน	94	68,401	8	7,504	86	60,897	60,897	100.00	3	2,491	3	2,491	4,499,000		2,491	100.00	0	0			0	0.00	2,491	100.00	-
11	ทวีวัฒนา	21	36,785	0	0	20	34,018	34,018	100.00	1	2,740	1	2,740			2,740	100.00	0	0			-	0.00	2,740	100.00	-
12	ทุ่งครุ	46	62,395	0	0	26	40,727	-	0.00	20	21,668	20	21,668	-	-	21,668	100.00	-	-	-	-	-	0.00	21,668	100.00	-
13	ธนบุรี	65	23,413	0	0	62	21,658	21,658	100.00	3	1,755	3	1,755	1,387,000		1,755	100.00	0	0			0	0.00	1,755	100.00	-

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนคู-คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คู-คลองที่ดูแลเปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						คู-คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา														หมายเหตุ			
				ดูแลประจำ		หมุนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		แผนงานปีนี้		ได้รับงบประจำปี				ผลงานงบประจำปี		ได้รับงบฯเพิ่มเติม				ผลงานงบฯเพิ่มเติม			ผลงานรวม		
		คู-คลอง	เมตร	คู-คลอง	เมตร	คู-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	คู-คลอง	เมตร	คู-คลอง	เมตร	งบประมาณ	วงเงินก้อนนี้	เมตร	ร้อยละ	คู-คลอง	เมตร	งบประมาณ	วงเงินก้อนนี้	เมตร	ร้อยละ		เมตร	ร้อยละ	
14	บางกอกน้อย	38	30,077	3	795	35	29,282	29,115	99.43	3	795	3	795	699,000	697,364	795	100.00	0	0			0	0.00	795	100.00	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	
15	บางกอกใหญ่	45	26,640	5	4,767	17	4,753	4,753	100.00	7	2,127	0	0			0	0.00	7	2,127	2,205,000	-	2,127	100.00	2,127	100.00		-
16	บางกะปิ	45	34,183	13	3,784	27	24,337	24,337	100.00	5	6,062	5	6,062	-	-	6,062	100.00	-	-	-	-	-	0.00	6,062	100.00		
17	บางขุนเทียน	119	177,817	16	36,781	8	7,217	7,217	100.00	19	17,835	19	17,835	16,212,000	-	17,835	100.00	-	-	-	-	-	0.00	17,835	100.00	-	
18	บางเขน	34	53,233	0	0	29	47,573	47,573	100.00	5	5,660	5	5,660	8,473,000	-	5,660	100.00	0	0			-	0.00	5,660	100.00	-	
19	บางคอแหลม	28	14,900	0	0	20	11,688	11,688	100.00	8	3,212	8	3,212	6,113,000		3,212	100.00	0	0			0	0.00	3,212	100.00	-	
20	บางแค	118	62,527	0	0	87	41,970	41,970	100.00	0	5,520	31	16,986			16,986	100.00	0	0			-	0.00	16,986	100.00	-	
21	บางซื่อ	23	11,775	0	0	23	11,775	11,775	100.00	0	0	0	0			0	0.00	0	0			0	0.00	0	0.00	-	
22	บางนา	6	6,310	0	0	5	5,760	5,760	100.00	1	550	1	550	1,708,000	922,000	550	100.00	0	0			-	0.00	550	100.00	-	
23	บางบอน	29	53,124	0	0	27	47,379	47,379	100.00	6	9,213	6	9,213	15,925,000	-	9,213	100.00	-	-	-	-	-	0.00	9,213	100.00	-	
24	บางพลัด	47	21,865	0	0	45	21,302	21,302	100.00	0	0	2	563	473,000	-	563	100.00	0	0	-	-	0	0.00	563	100.00	-	
25	บางรัก	9	1,817	0	0	9	908	908	100.00	2	909	2	909	1,205,000		909	100.00	0	0			-	0.00	909	100.00	-	
26	ปทุมวัน	37	34,636	0	0	26	26,051	26,051	100.00	10	8,007	10	8,007	10,829,000		8,007	100.00	0	0			0	0.00	8,007	100.00	-	
27	ปทุมวัน	6	2,410	0	0	4	1,710	1,710	100.00	0	0	0	0			0	0.00	0	0			0	0.00	0	0.00	-	
28	ประเวศ	39	46,516	0	0	13	25,164	25,164	100.00	6	5,500	6	5,500	3,966,000	3,966,000	5,500	100.00	0	0			-	0.00	5,500	100.00	-	
29	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	7	1,572	1	320	5	610	610	100.00	0	0	0	0			-	0.00	0	0			-	0.00	0	0.00	-	
30	พญาไท	5	1,666	2	536	3	1,130	1,130	100.00	0	0	0	0			0	0.00	0	0			0	0.00	0	0.00	-	
31	พระโขนง	28	11,823	0	0	28	11,147	11,147	100.00	0	0	0	0			0	0.00	0	0			0	0.00	0	0.00	-	
32	พระนคร	6	981	0	0	6	981	981	100.00	0	-	0	-		-	-	0.00	0	-		-	-	0.00	0	0.00	-	
33	ภาษีเจริญ	131	76,659	17	11,493	114	65,166	65,166	100.00	114	65,166	17	11,493	15,112,500	-	11,493	100.00	0	0			0	0.00	11,493	100.00	-	
34	มีนบุรี	51	57,112	17	25,067	34	32,045	32,045	100.00	17	25,067	17	25,067	32,666,100	-	25,067	100.00	-	-	-	-	-	0.00	25,067	100.00	-	
35	ยานนาวา	20	21,937	15	14,736	5	3,396	3,396	100.00	7	3,272	7	3,272	4,377,000		3,272	100.00	0	0			-	0.00	3,272	100.00	-	

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนคู-คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คู-คลองที่ดูแลเปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						คู-คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา														หมายเหตุ			
				ดูแลประจำ		หมุนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		แผนงานปีนี้		ได้รับงบประจำปี				ผลงานงบประจำปี		ได้รับงบฯเพิ่มเติม				ผลงานงบฯเพิ่มเติม			ผลงานรวม		
		คู-คลอง	เมตร	คู-คลอง	เมตร	คู-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	คู-คลอง	เมตร	คู-คลอง	เมตร	งบประมาณ	วงเงินก้อนนี้	เมตร	ร้อยละ	คู-คลอง	เมตร	งบประมาณ	วงเงินก้อนนี้	เมตร	ร้อยละ		เมตร	ร้อยละ	
36	ราชเทวี	6	1,098	0	0	6	1,098	1,098	100.00	6	1,098	0	0			-	0.00	0	0			-	0.00	0	0.00		
37	ราชบุรีบูรณ ะ	34	23,814	0	0	22	18,022	18,022	100.00	12	6,501	12	6,501	5,657,700	5,657,700	6,501	100.00	0	0			-	0.00	6,501	100.00	-	
38	ลาดกระบัง	59	108,363	0	0	55	101,763	98,500	96.79	4	6,600	4	6,600	12,718,000	8,282,255	5,925	89.77	0	0			0	0.00	5,925	89.77		
39	ลาดพร้าว	11	13,107	0	0	9	12,311	12,311	100.00	2	796	2	796	1,801,000	-	526	66.08	0	0			-	0.00	526	66.08	-	
40	วังทองกลาง	12	6,569	0	0	11	6,216	6,216	100.00	0	0	0	0			0	0.00	0	0			0	0.00	0	0.00	-	
41	วัฒนา	18	15,027	7	3,935	11	11,092	11,092	100.00	0	0	0	0			-	0.00	0	0			-	0.00	0	0.00	ขุดลอก คลองใช้ แรงงาน เขต	
42	สวนหลวง	27	21,169	0	0	27	21,169	21,169	100.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0	0.00	-	
43	สะพานสูง	21	24,606	5	9,550	12	12,323	12,323	100.00	4	2,733	4	2,733	-	-	2,733	100.00	-	-	-	-	-	0.00	2,733	100.00	-	
44	สัมพันธวงศ์	0	0	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00		
45	สาทร	5	2,717	0	0	5	2,717	2,717	100.00	0	0	0	0			-	0.00	0	0			-	0.00	0	0.00	-	
46	สายไหม	30	52,066	0	0	26	42,732	42,732	100.00	4	9,334	4	9,334	12,982,000	12,982,000	9,334	100.00	0	0			0	0.00	9,334	100.00	-	
47	หนองแขม	15	23,627	0	0	15	22,231	22,231	100.00	2	3,365	2	3,365	2,376,000	1,368,833	3,365	100.00	-	-	-	-	-	0.00	3,365	100.00	-	
48	หนองจอก	85	185,457	30	52,362	55	133,095	133,095	100.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0	0.00	-	
49	หลักสี่	19	14,303	0	0	10	11,895	11,895	100.00	1	650	1	650	2,170,676	-	650	100.00	-	-	-	-	0	0.00	650	100.00	-	
50	ห้วยขวาง	8	6,750	0	0	8	6,750	6,750	100.00	0	0	0	0			0	0.00	0	-			-	0	0.00	0	0.00	-
	รวม 50เขต	1,761	1,742,556	165	197,650	1,231	1,146,831	1,102,674	96.15	311	250,392	234	205,523	192,804,976	37,809,826	204,578	99.54	7	2,127	2,205,000	0	2,127	100.00	206,705	99.54	-	
51	สนน.	233	1,002,367	171	810,757	62	191,603	191,603	100.00	22	61,328	22	61,328	-	-	59,748	97.42	-	-	-	-	-	0.00	59,748	97.42	-	
	รวมเขต สนน.	1,994	2,744,923	336	1,008,407	1,293	1,338,434	1,294,277	96.70	333	311,720	256	266,851	192,804,976	37,809,826	264,326	99.05	7	2,127	2,205,000	0	2,127	100.00	266,453	99.06	-	
